
Inspection de votre étai d'extrémité Speed Shore

Inspecteur:_____ Date:_____

CROQUIS

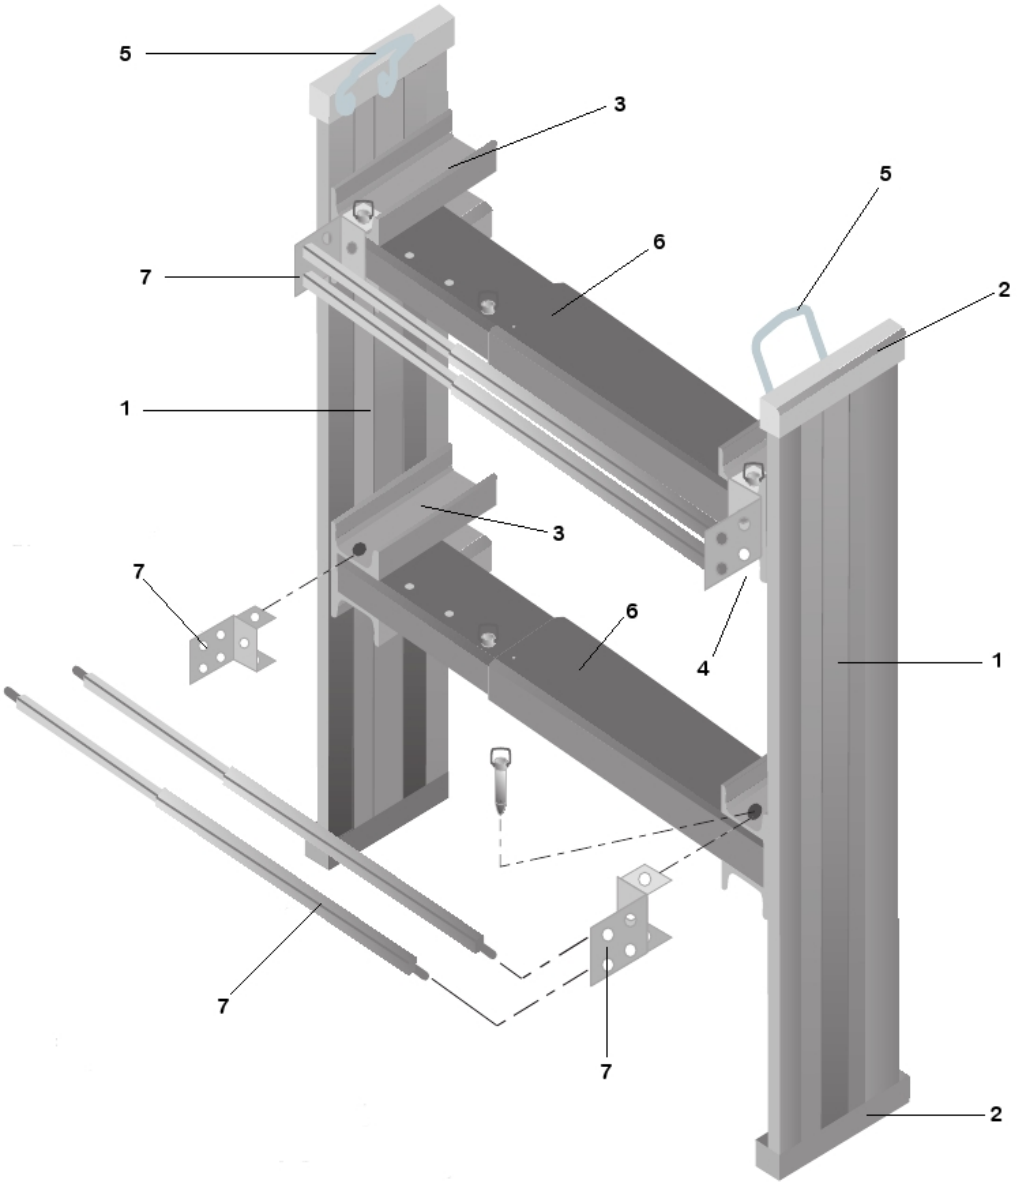

Inspection de votre étai d'extrémité Speed Shore

☐ **1. Panneau aluminium**
- □ Perforation, entaille ou déformation
- □ Boulon desserré ou manquant

☐ **2. Patin et coiffe**
- □ Déformation, usure ou dommage
- □ Boulon desserré, manquant ou soudure endommagée

☐ **3. Rail**
- □ Courbure excessive sur les points d'ancrage des étrésillons
- □ Courbure ou dommage sur la longueur du rail
- □ Boulon desserré ou manquant

☐ **4. Connecteur hydraulique**
- □ Usure ou mal fonctionnement
- □ Boyau hydraulique craquelé, sec ou perforé
- □ Boulon desserré ou manquant

☐ **5. Anneau de levage**
- □ Usure excessive, déformation

☐ **6. Étrésillon**
- □ Fuite lorsque sous pression
- □ Gaine en acier endommagée
- □ État de tous les connecteurs mâle
- □ État des goupilles et barrures
- □ Boulon desserré ou manquant

☐ **7. Fixation du panneau (Option)**
- □ Déformation
- □ Boulon desserré ou manquant
- □ Contreplaqué ¾" ou panneau d'extrémité endommagé

☐ **8. Aucune anomalie**
